

Trenque Lauquen, 29 de Junio de 2021

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
 EMPRENDIMIENTO: ACACIAS IV**

Estimados Inversores

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de acercarles un nuevo reporte de avance de obra del emprendimiento Acacias IV, ubicado en la calle Alem 859 de la ciudad de Trenque Lauquen.


En esta oportunidad queremos contarles que la obra se encuentra con un grado de avance del 88%.

En los últimos días avanzamos en la colocación de aberturas exteriores y barandas en los balcones de ambos bloques.

Continuamos los cielorrasos de durlock del bloque 2 y avanzamos en tareas de pintura interior en el bloque 1.

Comenzamos a colocar placares en los dormitorios y en cuanto a instalaciones, estamos trabajando en las conexiones eléctricas del gabinete de medidores a los tableros de viviendas.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra.

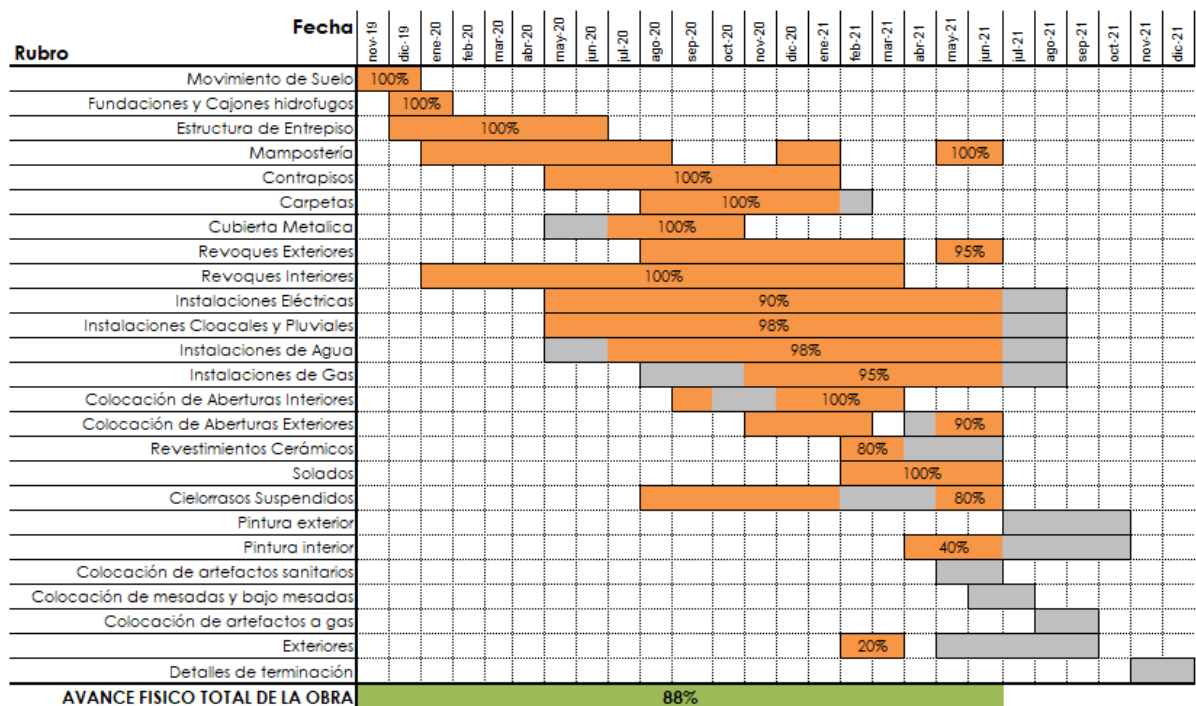

Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que para las próximas semanas realizaremos el contrapiso de hormigón en estacionamientos y detalles de terminación en muros.

Tenemos previsto continuar con las tareas de pintura en muros exteriores e interiores. También pintaremos marcos, puertas y zócalos de madera.

Comenzaremos a colocar muebles de cocina y finalizaremos la colocación de aberturas de aluminio.

Por último, tenemos programado terminar con las tareas de regulación de gas y conexión eléctrica de gabinete a tableros de viviendas.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el avance de las tareas realizadas hasta el momento.



Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
0810-2222-443
e-mail: info@grupogif.com.ar
web: www.grupogif.com.ar
