

Trenque Lauquen, 15 de enero 2025

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
 EMPRENDIMIENTO: EL CEIBO VI**

Estimados Inversores


Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de presentarles un nuevo informe de avance de obra, del emprendimiento El Ceibo VI, ubicado en Roca y Freyre de la ciudad de Trenque Lauquen.

En esta oportunidad queremos contarles que finalizamos la colocación de cubierta metálica y de las canaletas. Además, realizamos las cargas de los techos y el revoque de las mismas.

Seguimos avanzando con las tareas de revoque exterior e interior, como también con la instalación de cañeros y cajas de electricidad en los departamentos.

Actualmente estamos trabajando en las instalaciones sanitarias de agua, gas y cloaca

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.

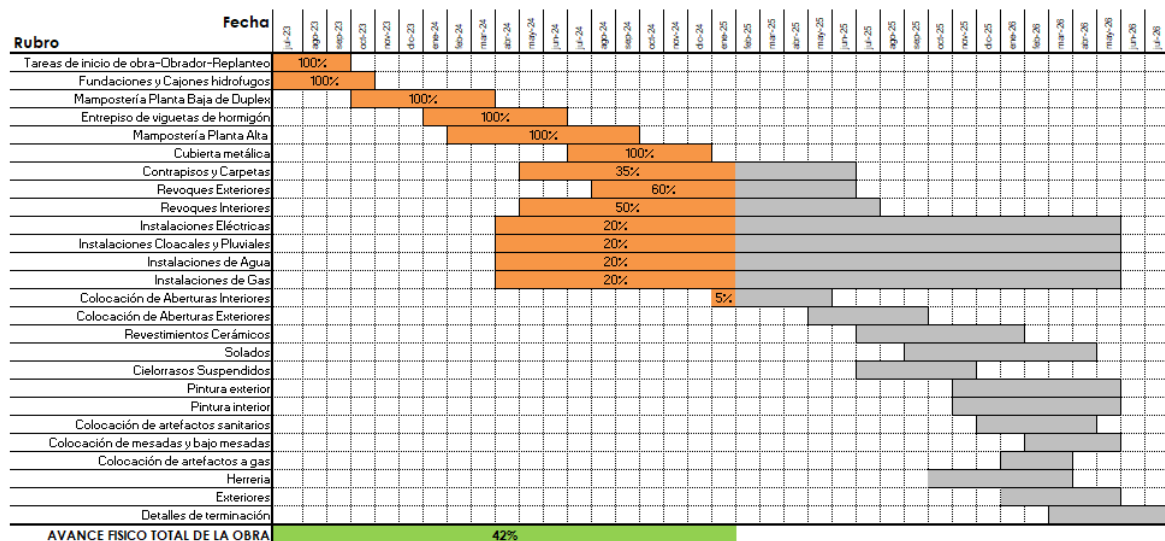

Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que en los próximos meses continuaremos trabajando con los revoques exteriores e interiores.

También seguiremos con las instalaciones de agua fría y caliente, gas y desagües pluviales, y las instalaciones eléctricas en los interiores de los departamentos.

Iniciaremos los recuadros de vanos para luego colocar las aberturas, y la colocación de las puertas interiores.

Además, tenemos programado iniciar con la carpeta en planta alta y el recuadro de cargas.


A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.



VISTA INSTALACIÓN SANITARIA



VISTA INTERNA DE LA OBRA

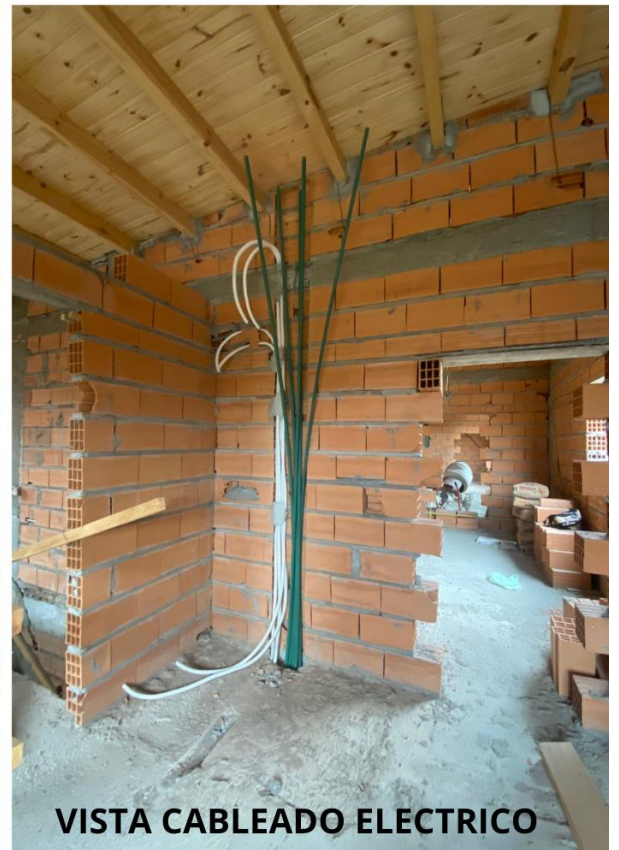

VISTA CABLEADO ELECTRICO



VISTA FRENTE DE LA OBRA



Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
web: www.grupogif.com.ar
